
Aan	: Kickstart deelnemers, Sectoren en Programma Medicatieoverdracht
Van	: Projectteam Kickstart - Rinske Holthuis (PL)
Datum	: Maandag 15 mei 2023
Versie	: 1.0
Onderwerp	: Addendum plan van aanpak Kickstart v3.1 - Nieuwe aanpassing Kickstartplanning vanwege vakantieperiode

Inleiding

Bij de start van de Kickstart is met de stuurgroep afgesproken eind Q1 2023 een evaluatie van de planning op te leveren. De planning is doorgesproken met de penvoerders GERRIT en Rijnmond, de leveranciers en de sectorprojectleiders.

Evaluatie

In Q1 2023 gaven een aantal Kickstart-leveranciers aan een vertraging in de planning van de Kickstart te verwachten door de zomer en kerstperiode. Dat leidt tot de volgende verlenging:

- fases 'Test stap 3 en 4' en 'Realisatie stap 5 en 6' met drie (3) weken te verlengen vanwege de zomervakantie 2023;
- fases 'Praktijktest stap 3 en 4' en 'Test stap 5 en 6' met een (1) week te verlengen vanwege de kerstvakantie 2023.


Dit resulteert in een totale verlenging van de duur van de Kickstart met een maand. De stuurgroep heeft op 12 mei 2023 akkoord gegeven op de nieuwe aanpassing van de Kickstartplanning. Dit is aanvullend op de eerdere aanpassing van de Kickstartplanning, zoals beschreven in 'Addendum Kickstartplanning Medicatieoverdracht'. Deze eerdere aanpassing is geaccordeerd door de stuurgroep op 2 november 2022.

Deze herziene planning is gebaseerd op de inschattingen in Q1 2023. De planning verandert mogelijk weer bij het ontstaan van nieuwe inzichten of veranderende omstandigheden. Dit wordt dan weer aan de stuurgroep voorgelegd.

Gevolgen wijzigingen in de planning

De aanpassing heeft gevolgen voor paragraaf 4.2 van het plan van aanpak v3.1 en het reeds geaccordeerde addendum ten aanzien van de planning. De doorlooptijd van de Kickstart wijzigt van **Q3 2022 tot en met Q3 2024** naar **Q3 2022 tot en met oktober 2024**. Deze wijziging resulteert in de aanpassing van figuur 4 uit het plan van aanpak v3.1 en is hieronder weergegeven.

Kickstart scope

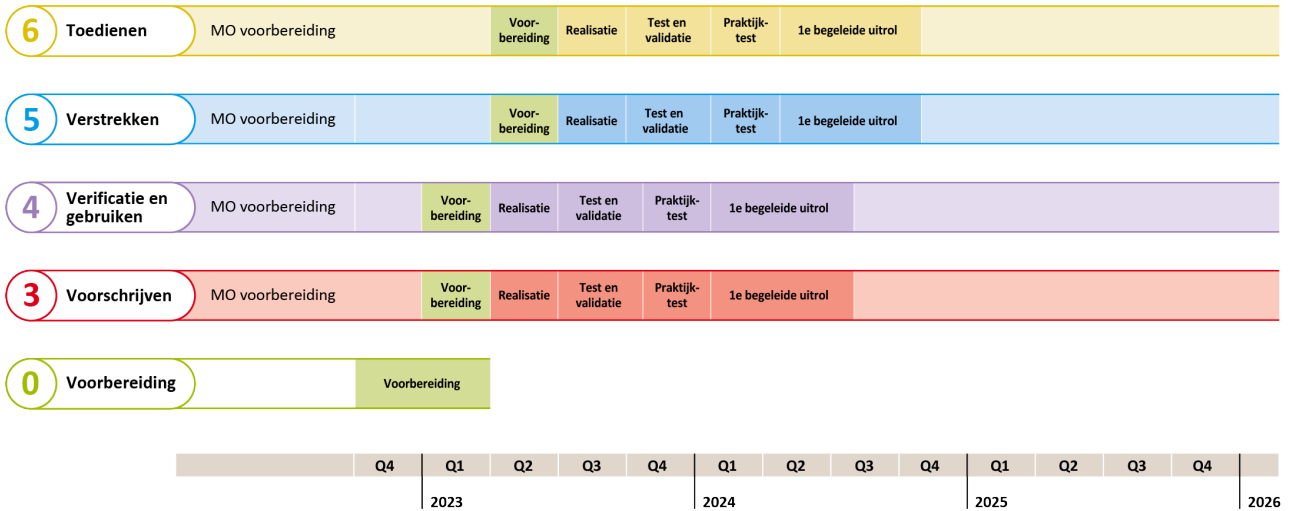

Voor de betreffende Kickstart fasen resulteert dit in de volgende aanpassingen op de planning:


Fase	Einddatum oud	Einddatum nieuw
Ontwikkeling 3/ 4	31 september 2023	20 oktober 2023
Praktijktest 3/4	31 december 2023	26 januari 2024
Begeleide uitrol 3/4	1 juli 2024	1 augustus 2024
Ontwikkeling 5/6	31 december 2023	26 januari 2024
Praktijktest 5/6	31 maart 2024	26 april 2024
Begeleide uitrol 5/6	1 oktober 2024	1 november 2024

Overige aanpassingen

Hieronder staan de overige aanpassingen ten gevolge van de wijziging van de planning. In **vet** staan de betreffende wijzigingen vermeld ten opzichte van het reeds geaccordeerde addendum.

- **Tekstuele aanpassing in paragraaf 4.2 Gefaseerde implementatie medicatie stappen, alinea 1, p. 18:** De voorgenomen doorlooptijd van de Kickstart is twee jaar en start vanaf oktober 2022. Voordat de richtlijn en informatiestandaard Medicatieproces breed uitgerold worden, moet uitgebreid getest worden om de zorgprocessen, techniek en bovensectorale samenwerking te beproeven en ervaringen op te doen met implementatie. Uitgaande van een startmoment in Q4 2022 geldt voor de stappen in scope van de Kickstart de in figuur 4 getoonde doorlooptijdenplanning tot en met **oktober 2024** (was Q3 2024).
- De figuren 4 t/m 9, 11, 12 en 14 (hoofdstuk 4 Aanpak) zijn daarbij tevens aangepast. Alle fasen binnen deze planning verschuiven met een maand. Aan de inhoud van deze fasen en stappen is niets gewijzigd.
- De go/no-go beslismomenten zoals aangegeven in figuur 14 wijzigen daarmee naar de volgende momenten aangegeven met donkerblauwe cirkels:

Kickstart scope

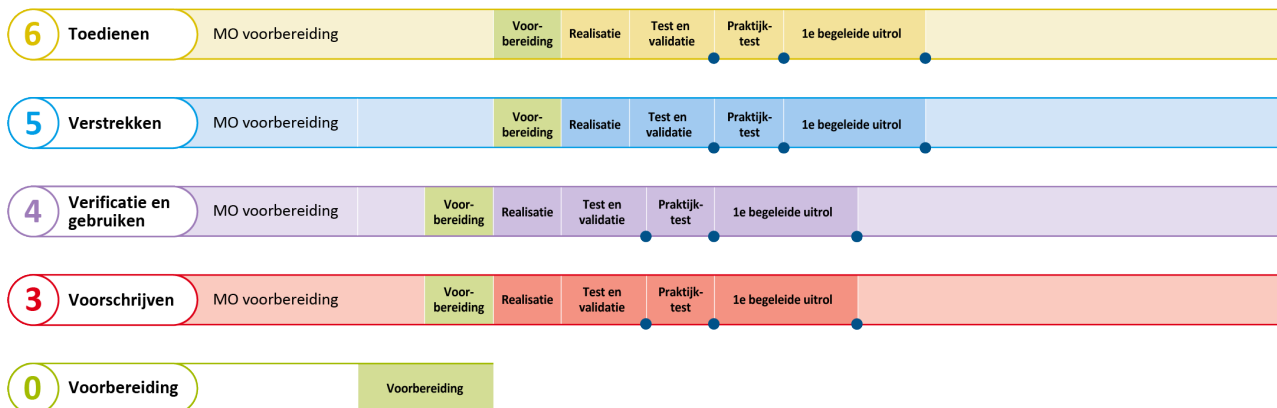

● Go / No go
